

**Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения при
Государственном Агентстве водных ресурсов при Правительстве Кыргызской
Республики**

Проект «Управления сточными водами Иссык-Куля»

Отчет о ходе реализации за период, оканчивающийся 31 декабря 2019 г

1. Введение

1. Настоящий отчет был подготовлен с целью обобщения результатов прогресса, достигнутых по проекту «Управления сточными водами Иссык-Куля» (ПУСВИК) за 4 квартал 2019 года. Структура данного отчета основана на формате, утвержденном АБР, и структура формата должна быть включена при пересмотре Руководства по администрированию проекта.

2. Проект «Управления сточными водами Иссык-Куля» (далее - Проект) будет оказывать поддержку Правительству Кыргызской Республики в улучшении услуг по очистке сточных вод в двух городах, расположенных в восточном регионе страны в прибрежной зоне озера Иссык-Куль. Проектом предусматривается модернизация и расширение существующих систем очистки сточных вод, укрепление институционального потенциала и повышение устойчивости коммунальных служб водоснабжения и канализации (ВСС) в Балыкчы и Караколе.

3. В Таблице 1 представлена общая информация по проекту:

Таблица 1 - Общая информация по проекту:

Общая стоимость проекта	41.82 млн \$США
Номер проекта	50176-002
Грант 0628-KGZ (SF)	12,84 млн. \$США – из Специальных фондовых ресурсов Азиатского банка развития (АБР)
Кредит 3742 – KGZ (COL)	23,68 млн. \$США – из Обычных капитальных ресурсов Азиатского банка развития
Правительство КР	5.30 млн. \$США (включая налоги и пошлины в качестве софинансирования)
Исполнительное агентство	Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения (ДРПВВ) при Государственном агентстве водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республике
Реализующее агентство	Полномочное Представительство Правительства КР в Иссык-Кульской области
Сроки реализации проекта	16 августа 2019 – 31 декабря 2024
Дата финансового закрытия проекта	30 июня 2025г
Зона реализации проекта	Города Балыкчы и Каракол
Орган, контролирующий проект	Миссия постоянного представительства АБР в КР (KYRM)
Одобрение Советом директоров АБР	20 ноября 2018
Подписание Грантового и Кредитного Соглашений	28 декабря 2018
Подписание Закона Кыргызской Республики № 60 «О ратификации Кредитного Соглашения»	16 июля 2019 г

Закон опубликован в газете «Эркин Тоо»	19 июля 2019 года №60
Дата вступления в силу. Подтверждение АБР	16 августа 2019 года

4. Основные ожидаемые результаты проекта включают следующее:

Результат 1: Улучшение систем отведения сточных вод в городах Балыкчы и Каракол, в том числе: (i) восстановление канализационных очистных сооружений КОС в городах Балыкчы (производственная мощность 4,200 м³/сут) и Каракол (производственная мощность 12,000 м³/сут), (ii) строительство канализационных сетей протяженностью 21,6 км и отводящих трубопроводов протяженностью 1,7 км, (iii) строительство новой насосной станции и насосного отводящего трубопровода в Караколе, (iv) очистка от ила пруда-накопителя в Караколе и (v) предоставление семи передвижных ассенизаторских машин.

Результат 2: Укрепление институционального потенциала и улучшение реализации проекта в Балыкчы и Караколе через: (i) программу развития корпоративного потенциала, (ii) целенаправленные модули обучения основным корпоративным знаниям, ЭИТО и системам финансового управления и биллинга и (iii) сотрудничество с международным центром знаний о ВСИВО.

Результат 3: Улучшение мер по управлению септическими осадками и повышение осведомленности о вопросах охраны окружающей среды посредством программ, направленных на: (i) совершенствование нормативной базы, касающейся управления септическим осадком, рационализации услуг по сбору септических осадков и улучшения работы по удалению септических осадков; (ii) повышение осведомленности о передовом опыте в области санитарии и поощрение поддержки со стороны заинтересованных сторон касательно мер по улучшению водоотведения

2. Прогресс по реализации проекта

2.1. Общая информация по прогрессу реализации проекта

5. Основные этапы реализации проекта, достигнутые за IV квартал 2019 года, включают следующее:

- a. найм сотрудников ОУП: специалиста по ИТ, водителя
- b. найм международных консультантов: главного технического советника, международного консультанта по закупкам;
- c. закуплена оргтехника и программное обеспечение для ОУП и обоих ОРП;
- d. начало ведения переговоров с международной консультационной компанией касательно предоставления услуг по проектированию и надзору;
- e. 11 октября 2019 г. мэрия г. Каракол сформировала рабочую группу для продвижения проекта; Реализующее агентство и ОРП г. Каракол провели заседание по статусу реализации данного проекта - 20 октября 2019 г.;
- f. 31 октября 2019 г. 2 сотрудника ОУП прошли обучение по процедурам закупок ОУП.

6. Мероприятия по проекту проводились в соответствии с компонентами проекта/промежуточными результатами.

2.2. Возникшие и разрешенные проблемы

7. Постановлением Правительства КР от 30 июля 2019 года № 383, в целях совершенствования управления водными ресурсами и водохозяйственным комплексом Кыргызской Республики, ведения единой водной политики, а также реализации положений Водного кодекса Кыргызской Республики на базе Департамента водного хозяйства и мелиорации при Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики образовано Государственное агентство водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики (ГАВР ПКР) с передачей в его ведение Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения (ДРПВВ)

Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики с соответствующими функциями, бюджетным финансированием, движимым и недвижимым имуществом, документацией и штатной численностью 33 единицы основного персонала и 7 единиц технического и младшего обслуживающего персонала.

8. Вышеуказанным постановлением Правительства КР утверждена Схема управления ГАВР, согласно которой ДРПВВ стала подведомственным подразделением ГАВР. Руководство ГАВР предоставило проект Положений о Департаменте развития питьевого водоснабжения и водоотведения на одобрение Правительству Кыргызской Республики.

9. МФ КР от 23.10.2019 года №16-2-1/13027 направило уведомление в АБР относительно структурного изменения и переименования Исполнительного агентства Проекта «Управление сточными водами Иссык-Куля» - Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения.

10. ОУП и оба ОРП созданы Исполнительным и Реализующим агентствами. Ключевые сотрудники ОУП отобраны 22 июля 2019 года и процедура отбора международного Главного технического советника (ГТС) и Международного специалиста по закупкам были начаты 6 июня 2019 года. Контракт с ГТС подписан 17 октября 2019 г., с международным консультантом по закупкам контракт подписан 1 декабря 2019 г.

11. После консультаций и согласований с АБР была изменена организационная структура по проекту, поскольку согласно первоначальной концепции должен был отдельно привлечен Консультант по управлению проектом, однако большая часть функций могла бы выполняться ОУП с помощью международных специалистов в области управления окружающей средой и социальных защитных мер и переселения. Дополнительные условия для привлечения этих специалистов были предусмотрены в контракте консультационных услуг по проектированию и надзору. Изменённая структура проекта представлена на Рисунке 1.

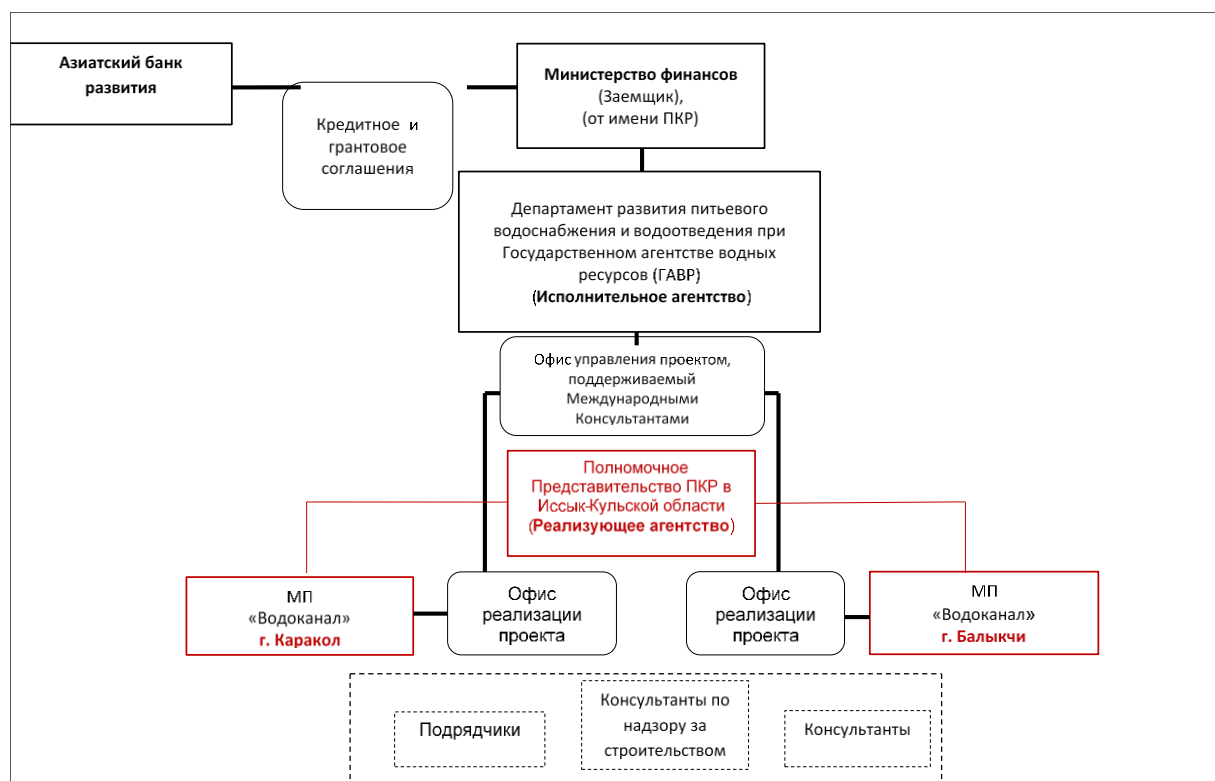


Рис. 1 – Структура реализации проекта
